



# PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD

ESE. Hospital Rosario Pumarejo de López

**Dra. ANGÉLICA DÍAZGRANADOS AMAYA**

**Prof. Esp. Delegada proyectos de salud**

**Ing. MARÍA CAMILA CAPATAZ SALGADO**

**Prof. De apoyo Proyectos**

**CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL  
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL  
ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ DE  
VALLEDUPAR-CESAR**



## OBJETIVO GENERAL

Mejorar la prestación del servicio para los pacientes que requieren atención de urgencias en el HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ ESE DE VALLEDUPAR, como centro de referencia del departamento CESAR

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Construir y ampliar la capacidad resolutive del servicio de urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de López

Cumplir con la normatividad vigente para la prestación adecuada de servicios de salud

Proyecto inscrito y aprobado en plataforma del Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud - PBIPS 2016 -2017

Migrado a las vigencias 2018-2019 y 2020- 2021.



## CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL vs CAPACIDAD AMPLIADA

| AREA DE SERVICIO         |                                | ESPACIO<br>ACTUAL | ESPACIO<br>PROPUESTO | CAPACIDAD INSTALADA<br>ACTUAL |           |          | CAPACIDAD AMPLIADA |           |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|
| URGENCIAS                |                                |                   |                      | CAMAS                         | CAMILLA   | SILLAS   | CAMAS              | CAMILLAS  |
| CONSULTORIO<br>DE TRIAGE | PEDIATRICO                     | 1                 | 1                    | 0                             | 1         | 2        | 0                  | 1         |
|                          | GENERAL                        |                   | 2                    |                               |           |          |                    | 2         |
|                          | OBSTETRICO                     | 1                 | 1                    | 0                             | 1         | 2        | 0                  | 1         |
| CONSULTORIOS             | PEDIATRICO                     | 1                 | 1                    | 0                             | 1         | 2        | 0                  | 1         |
|                          | GENERAL                        | 2                 | 3                    | 0                             | 3         | 6        | 0                  | 3         |
|                          | OBSTETRICO                     | 1                 | 1                    | 0                             | 1         | 2        | 0                  | 1         |
| SALAS                    | REANIMACION<br>PEDIATRICA      | 1                 | 1                    | 0                             | 2         | 2        | 0                  | 2         |
|                          | REANIMACION<br>ADULTOS         | 1                 | 1                    | 0                             | 1         | 0        | 0                  | 2         |
|                          | SALA ERA                       | 1                 | 1                    | 0                             | 0         | 0        | 0                  | 0         |
|                          | SALA EDA                       | 0                 | 1                    | 0                             | 0         | 0        | 0                  | 5         |
|                          | SALA DE YESO                   | 1                 | 1                    | 0                             | 1         | 0        | 0                  | 1         |
|                          | PROCEDIMIENTO<br>S PEDIATRICOS | 1                 | 1                    | 0                             | 1         | 0        | 0                  | 2         |
|                          | PROCEDIMIENTO<br>S ADULTOS     | 1                 | 1                    | 0                             | 11        | 0        | 0                  | 4         |
| SALA DE<br>OBSERVACIÓN   | MUJERES                        | 2                 | 1                    | 9                             | 27        | 0        | 0                  | 30        |
|                          | HOMBRES                        | 2                 | 1                    | 9                             | 15        | 0        | 0                  | 25        |
|                          | PEDIATRICAS                    | 1                 | 1                    | 0                             | 15        | 0        | 0                  | 15        |
|                          | SALUD MENTAL                   | 1                 | 0                    | 0                             | 10        | 0        | 0                  | 0         |
|                          | OBSTETRICIA                    | 1                 | 1                    | 0                             | 5         | 0        | 0                  | 10        |
| <b>TOTAL</b>             |                                |                   |                      | <b>18</b>                     | <b>72</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>80</b> |

Fuente: Presupuesto proyecto.2019




## CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL vs CAPACIDAD AMPLIADA

| OTROS AMBIENTES                     |  | CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL * | CAPACIDAD INSTALADA PROPUESTA |
|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| AREAS ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIOS | OFICINA DE COORDINACION MÉDICA URGENCIAS                     | 1                            | 1                             |
|                                     | OFICINA DE COORDINACION ENFERMERIA DEL SERVICIO DE URGENCIAS | 1                            | 1                             |
|                                     | OFICINA DE COORDINACION ADMISIONES                           | 1                            | 1                             |
|                                     | OFICINA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA                     | 1                            | 1                             |
|                                     | FACTURACION Y CAJA.  | 1                            | 1                             |
|                                     | AREA DE ADMISIONES   | 1                            | 1                             |

Fuente: Presupuesto proyecto.2019



# ÁREA CONSTRUIDA ACTUAL vs ÁREA A AMPLIAR

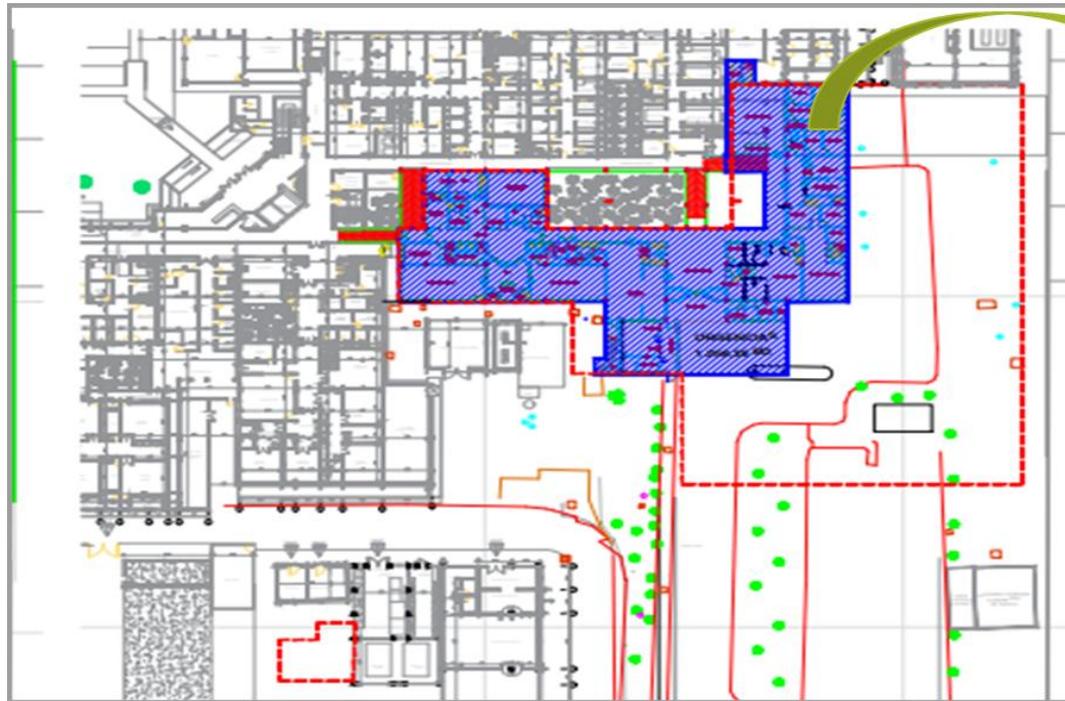

-  Área construida actual.
-  Área a ampliar

Fuente: Planos Arquitectónicos proyecto.2019

1.258,28mts



1.685,9  
mts

2.944,18  
mts

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Valor del proyecto | \$ 11.436.186.938,07 |
| Área a construir   | 2944,18              |

Fuente: Presupuesto proyecto.2019

| Nivel de Avance                | % CUMPLIMIENTO | ENTIDAD   |
|--------------------------------|----------------|-----------|
| Viabilidad Técnica MSPS        | 100%           | MSPS-SSD  |
| Viabilidad Financiera Aprobada | 50%            | MSPS      |
| Viabilidad Financiera Aprobada | 50%            | SGR DPTO. |

Fuente: Ofc. Proyecto. ESE HRPL. Taller Construyendo País No.32.2019. Acta No 065 Julio 2020 OCAD CESAR.



Radicación versión final del proyecto Diciembre 2018

Viabilidad Técnica MSPS - 04 de enero del 2019

Gestión de concertación fuentes de financiación

Viabilidad financiera en el Taller Construyendo País No.32 en Valledupar-25 de mayo de 2019. Cofinanciación 50% MSPS Y 50% Sistema General de Regalías - SGR

El MSPS asigna recursos a la ESE HRPL Resolución 3373 del 18 de diciembre del 2019, por valor de \$5.718.000.000.

Ajustes de observaciones para el cumplimiento de los requerimientos documentales del Sistema General de Regalías (Acuerdo 45 de 2017 y 52 de 2018)

Cumplimiento de requisitos de los Acuerdos 45 de 2017 y 052 del 2018 del Sistema General de Regalías - Cargue de información adicional al SUIFP

Cumplimiento de observaciones adicionales dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social - Cargue de información adicional al SUIFP - Pronunciamiento técnico de pertinencia emitido por el MSPS 24/06/2020

Presentación del proyecto al OCAD CESAR, el cual viabiliza, prioriza y aprueba cofinanciación del 50% del proyecto mediante Acta No 065 de Julio del 2020

**DATO IMPORTANTE:**

El Sistema de evaluación por puntajes para priorización de proyectos en el Sistema General de Regalías dio un puntaje de 97,20 sobre 100.

**ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN FASE DE CUMPLIMIENTO DE  
REQUISITOS Y PROCESO DE EJECUCIÓN.**





# GRACIAS

---
